

LGV BPL - Suivi du respect des engagements de l'État

Comité de Suivi départemental de la Sarthe – 8 novembre 2016

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergie et climat Développement durable
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

Présent
pour
l'avenir



Ministère de l'Écologie, de l'Énergie et de la Mer

Engagements de l'État - rappels

- Issus de la procédure DUP, ils matérialisent les engagements de l'État et du maître d'ouvrage en matière d'environnement et d'insertion dans les territoires traversés
- Complétés par RFF en 2010 au fur et à mesure de l'avancement des études et des engagements pris dans les concertations locales
- Dossier diffusé début 2009 dans le cadre des comités de suivi départementaux
- **1031** engagements (dont 1018 sur périmètre ERE) de deux types :
 - **de portée générale** (grands principes) : 195
 - **localisés** (traitement des points sensibles identifiés) : 221 en Ille-et-Vilaine, 266 en Mayenne, 349 en Sarthe



Engagements de l'État – suivi

- Un tableau de suivi de l'ensemble des engagements a été mis au point par ERE
- Il est mis à jour au fur et à mesure de l'avancement du projet
- Un « organisme technique » (SYSTRA - ARTELIA) a été mandaté pour contrôler le respect des engagements: il réalise notamment des audits (visites de terrain...) pour contrôler la mise en œuvre
- Un premier bilan intermédiaire a été dressé à la fin des études détaillées et des procédures réglementaires et a été présenté en Sarthe lors du comité de suivi du 6 juin 2014

→ *il était alors proposé de considérer que **l'ensemble des engagements qui pouvaient être vérifiés (les travaux étant en cours) étaient respectés***

Engagements de l'État – principes d'analyse

- La fin des travaux permet de dresser un bilan quasi-final du respect des engagements de l'État
- Bilan dressé par ERE fin juin 2016, examiné par la SNCF-Réseau et la DREAL, soumis aux services de l'État dans les 3 départements en septembre-octobre 2016 et objet d'un avis de l'organisme technique en octobre 2016
- Les engagements de l'État sont vérifiés un par un et peuvent être classés en différentes catégories :
 - Engagements respectés
 - Engagements non respectés
 - Engagements inactivés : l'évolution du projet depuis la prise de l'engagement les ont rendus caducs
 - Engagements non respectés mais résolus : des solutions alternatives ont été trouvées, les études ont remis à jour les enjeux ou la concertation a conduit à retenir une autre solution
 - Certains engagements sont constatés comme provisoirement respectés

Engagements de l'État – exemples


- Exemple d'engagements inactivés en Sarthe :
 - Création d'un plan d'eau en substitution d'une mare détruite → le projet ne touche finalement pas la mare
 - Mise en place d'une protection acoustique → bâtiment à protéger finalement acquis et démoli
- Exemple d'engagements non respectés mais résolus en Sarthe:
 - Décaler l'axe du tracé pour préserver des exploitations agricoles → un raidissement de talus et une modification de la conception de la voie latérale permet d'épargner les exploitations sans toucher à l'axe du tracé
 - Une voie de désenclavement agricole prévue → la démarche d'aménagement foncier ne l'a plus ensuite jugé utile
- Engagements dont le respect peut-être provisoirement constaté mais reste à confirmer :
 - Il s'agit des dernières plantations pour insertion paysagère ou compensations environnementales, mais programmées à l'automne 2016 ou début 2017
 - Ou de la remise en état des bases travaux
 - Ou encore de quelques cas particuliers a priori réalisés mais qui nécessitent un constat de terrain non fait à date du jour

Engagements de l'État – bilan (1)

	Engagements généraux		TOARC A		TOARC B		TOARC C		TOARC D		TOARC E		TOARC F		TOARC G		Total	
Inactivé	0	0%	4	3%	4	3%	4	6%	4	3%	5	5%	4	3%	5	5%	30	3%
Respecté	180	92%	128	90%	131	87%	57	83%	101	86%	71	76%	136	89%	95	86%	899	87%
Respecté Provisoirement	14	7%	1	1%	5	3%	0	0%	4	3%	8	9%	5	3%	3	3%	40	4%
Non respecté mais résolu	1	1%	9	6%	11	7%	8	12%	9	8%	10	11%	7	5%	7	6%	62	6%
Non respecté	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Cumul	195	100%	142	100%	151	100%	69	100%	118	100%	94	100%	152	100%	110	100%	1031	100%


Sarthe = TOARC E, F, G

Engagements de l'État – bilan (2)

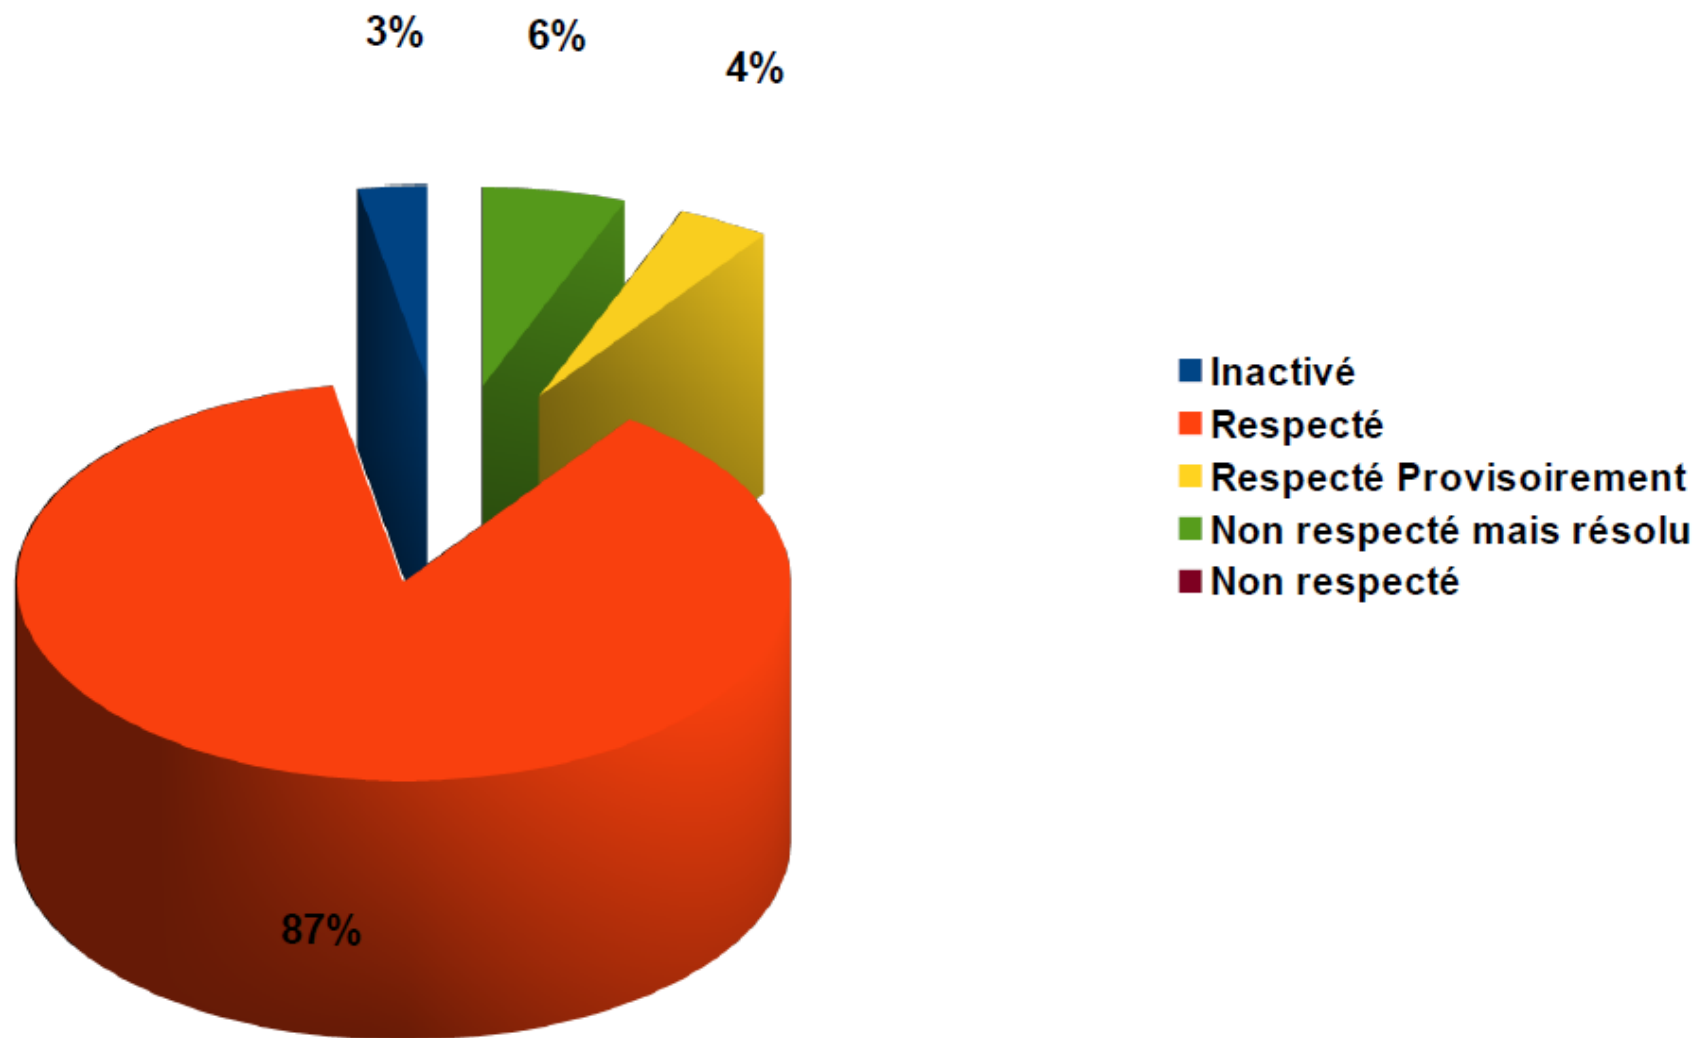

Engagements de l'État – bilan (3)

Sarthe - répartition des engagements localisés par type de thématique

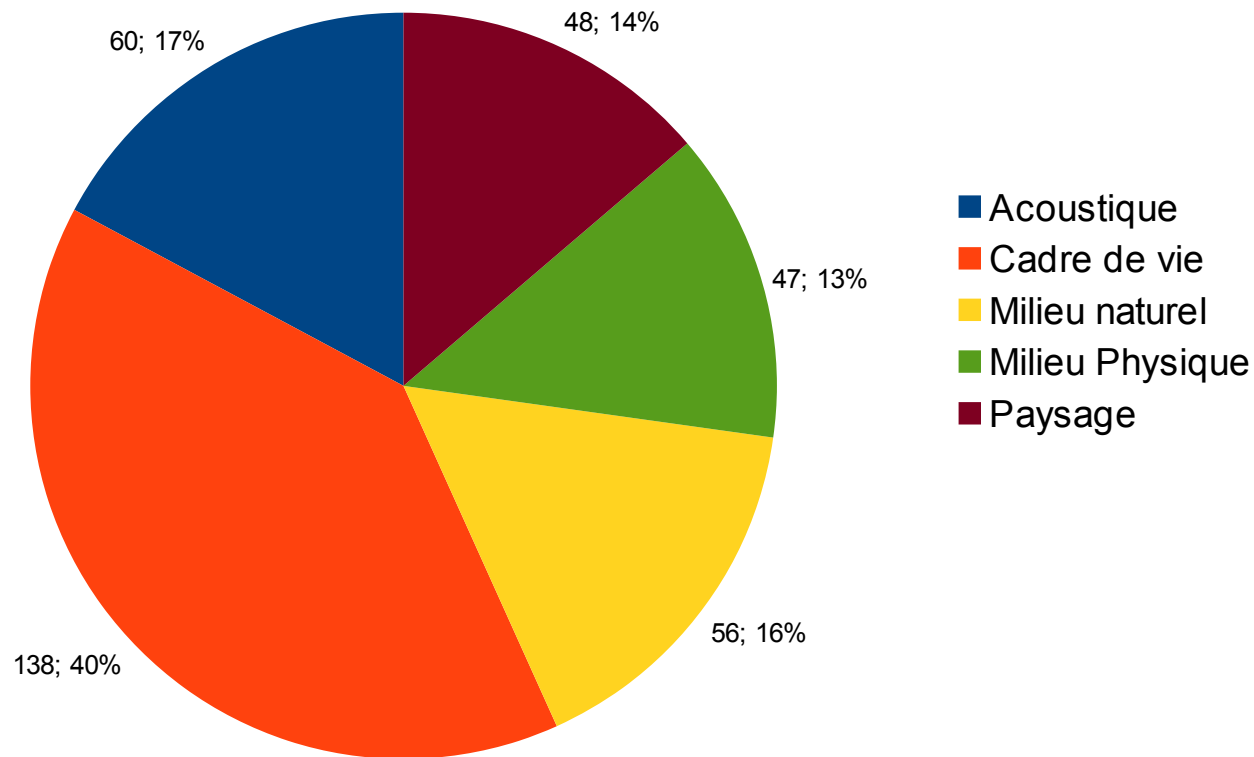

Engagements de l'État – suites

- Il est donc proposé **d'acter le respect des engagements de l'Etat à la fin des travaux**
- Remise ce jour de tableaux de suivi détaillés
- Réactions éventuelles attendues jusqu'au 16/01/2017 (à transmettre par écrit à la Préfecture exclusivement)
Avis attendu sur les conditions de respect de l'engagement, sans remise en cause de l'engagement lui-même ou des concertations antérieures ou rajout d'un nouvel engagement
- Validation ensuite formelle par l'État : dans le comité de suivi inter-régional des financeurs, présidé par le Préfet de Région Bretagne, coordonnateur du projet, et auquel participe les 3 Préfets de Département – avant l'été 2017 après le recueil des remarques éventuelles dans les 3 départements
